


E3 - ÉPREUVE DE RÉALISATION D'UN OUVRAGE

Sous-épreuve E33 - Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier

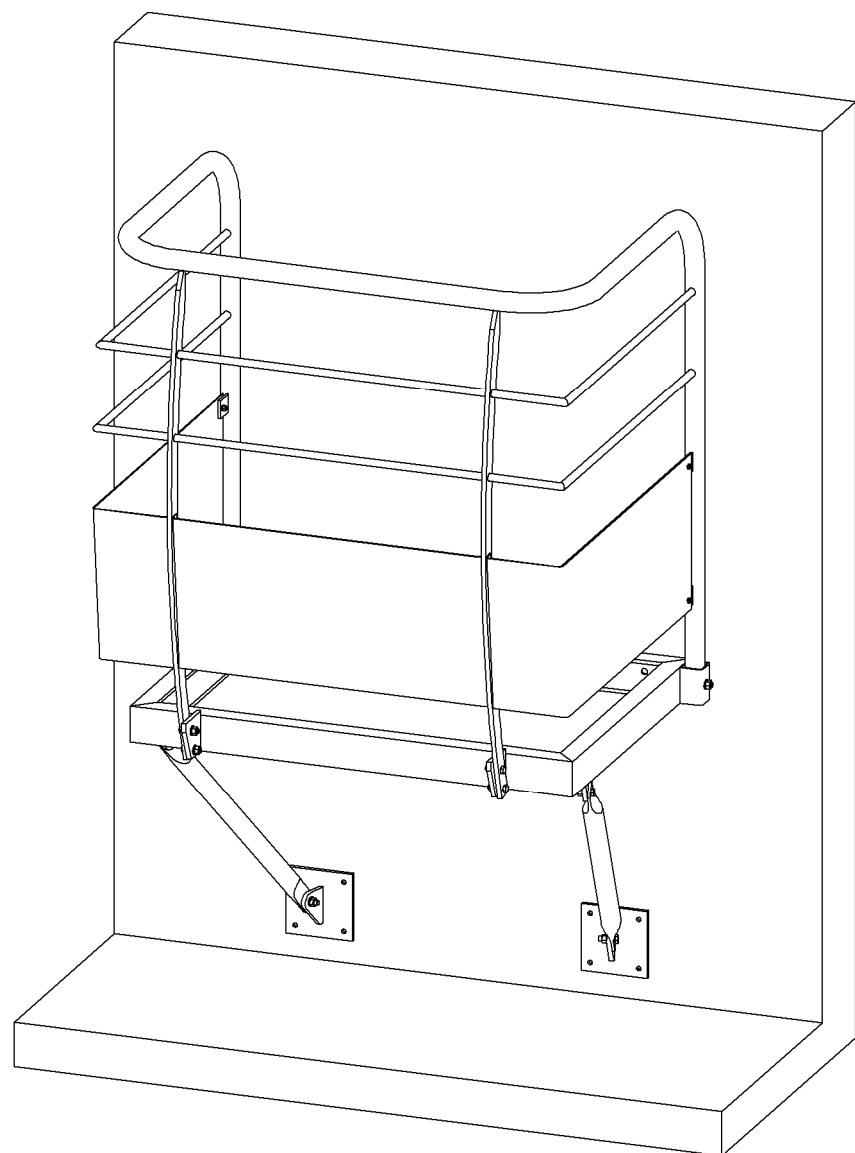

Compétences évaluables

- C1.4 - Relever et réceptionner le site de pose et/ou d'installation.
- C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention.
- C4.2 - Contrôler la conformité des supports et des ouvrages.
- C4.3 - Implanter, tracer, distribuer les ouvrages.
- C4.4 - Préparer, adapter, ajuster les ouvrages.
- C4.5 - Conduire les opérations de pose sur chantier.
- C4.6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires.
- C4.7 - Gérer la dépose des ouvrages et l'environnement du chantier.
- C5.1 - Assurer la maintenance des ouvrages.

DOSSIER ÉVALUATION

Ce dossier comporte 2 pages :
DE 1 à DE 2.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Note : les documents sont au format A3.

Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE	2006-OBM P 33	Session 2020	ÉVALUATION
Sous-épreuve E33 - Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier	Durée : 5 heures	Coefficient : 3	DE 1 / 2

<u>BARÈME DE NOTATION</u>	
Contrôle de la conformité du support : les différents contrôles sont réalisés sans erreurs	/30
Mise en sécurité et organisation de la zone d'intervention : le site est mis en sécurité et correctement organisé	/10
Cote d'implantation horizontale : 500 mm \pm 5	/10
Cote d'implantation horizontale : 875 mm \pm 5	/10
Horizontalité : 3 mm / longueur du plancher maximum	/20
Verticalité : 3 mm / largeur du plancher maximum	/20
Ancrage des chevilles mâles à expansion M12 : les chevilles sont correctement ancrées et opérantes	/30
Ancrage des vis à béton \varnothing 8 : les vis sont correctement ancrées et opérantes	/40
Montage du garde-corps sur le plancher : le garde-corps est fixé par les 6 boulons opérants	/20
Remise en état de la zone d'intervention : le rangement des outils et le nettoyage du site est correctement réalisé	/10
TOTAL	/200
