Planning du chantier Résidence des Balançoires

Création d'une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique BT

Sélectionner une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit.

Période à mettre 59
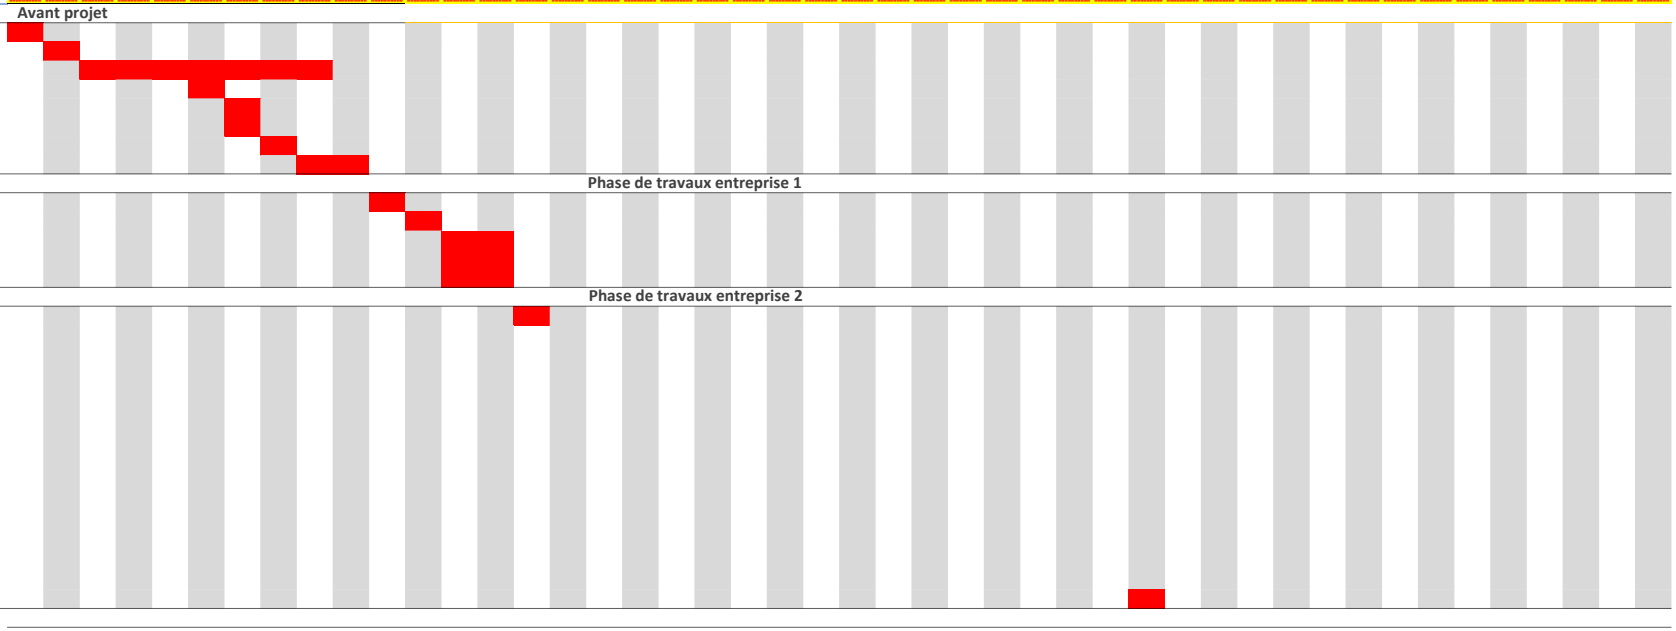
Entreprise	ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN EN JOURS
	Avant projet		
fournisseur historiqu	Ouverture comptable	31/08/2020	1
fournisseur historiqu	Affectation des entreprises	01/09/2020	1
fournisseur historiqu	Réunion de chantier	02/09/2020	9
fournisseur historiqu	commande de matériel	07/09/2020	1
fournisseur historiqu	validation de projet	08/09/2020	1
fournisseur historiqu	Demande de consignation de réseau	08/09/2020	1
fournisseur historiqu	Déclaration de travaux	09/09/2020	1
fournisseur historiqu	Avis d'exploitation	10/09/2020	2
	Phase de travaux entreprise 1		
MOULOT S.A	Reception matériel	14/09/2020	1
MOULOT S.A	percement	15/09/2020	1
MOULOT S.A	réalisation de liaison HTA	16/09/2020	2
MOULOT S.A	Tirage de câble 2x10 mètres de câble 3x240²+neutre alu	16/09/2020	2
MOULOT S.A	Tirage de câble 2x10 mètres de câble 3x240²+neutre alu	16/09/2020	2
	Phase de travaux entreprise 2		
CMELEC	Reception du matériel	21/09/2020	1
CMELEC	Pose des IS Pompier 2x400A aux 6 SPCM	22/09/2020	3
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 (A) travée 1	25/09/2020	2
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-2 (A) travée 1	25/09/2020	2
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 (B) travée 2	28/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 (B) travée 2	28/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-2 (B) travée 2	29/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-2 (B) travée 2	29/09/2020	1
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 © travée 3	30/09/2020	2
CMELEC	Réalisation du chemin de câble NIV-1 © travée 3	30/09/2020	2
CMELEC	Tirage de câble N-1 travée 1-2-3	02/10/2020	4
CMELEC	Tirage de câble N-2 travée 1-2-3	02/10/2020	4
CMELEC	Installation raccordement IRVE N-1 travée 1-2-3	08/10/2020	4
CMELEC	Installation raccordement IRVE N-2 travée 1-2-3	08/10/2020	4
CMELEC	Raccordement des bornes au réseau Communication	13/10/2020	1
CMELEC	Essais et mise en service	14/10/2020	1
