

# Document réponse DRM1/2

Justifier la phase à partir de laquelle vous commencez votre graphe :


Académie: \_\_\_\_\_ Session: \_\_\_\_\_  
 Examen ou Concours \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_  
 Spécialité/option: \_\_\_\_\_ Repère de l'épreuve: \_\_\_\_\_  
 Epreuve/sous épreuve: \_\_\_\_\_  
 Nom: \_\_\_\_\_  
(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)  
 Prénoms: \_\_\_\_\_ N° du candidat   
(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)  
 Né(e) le: \_\_\_\_\_

NE RIEN ECRIRE

DANS CE CADRE

NE RIEN ECRIRE


DANS CE CADRE

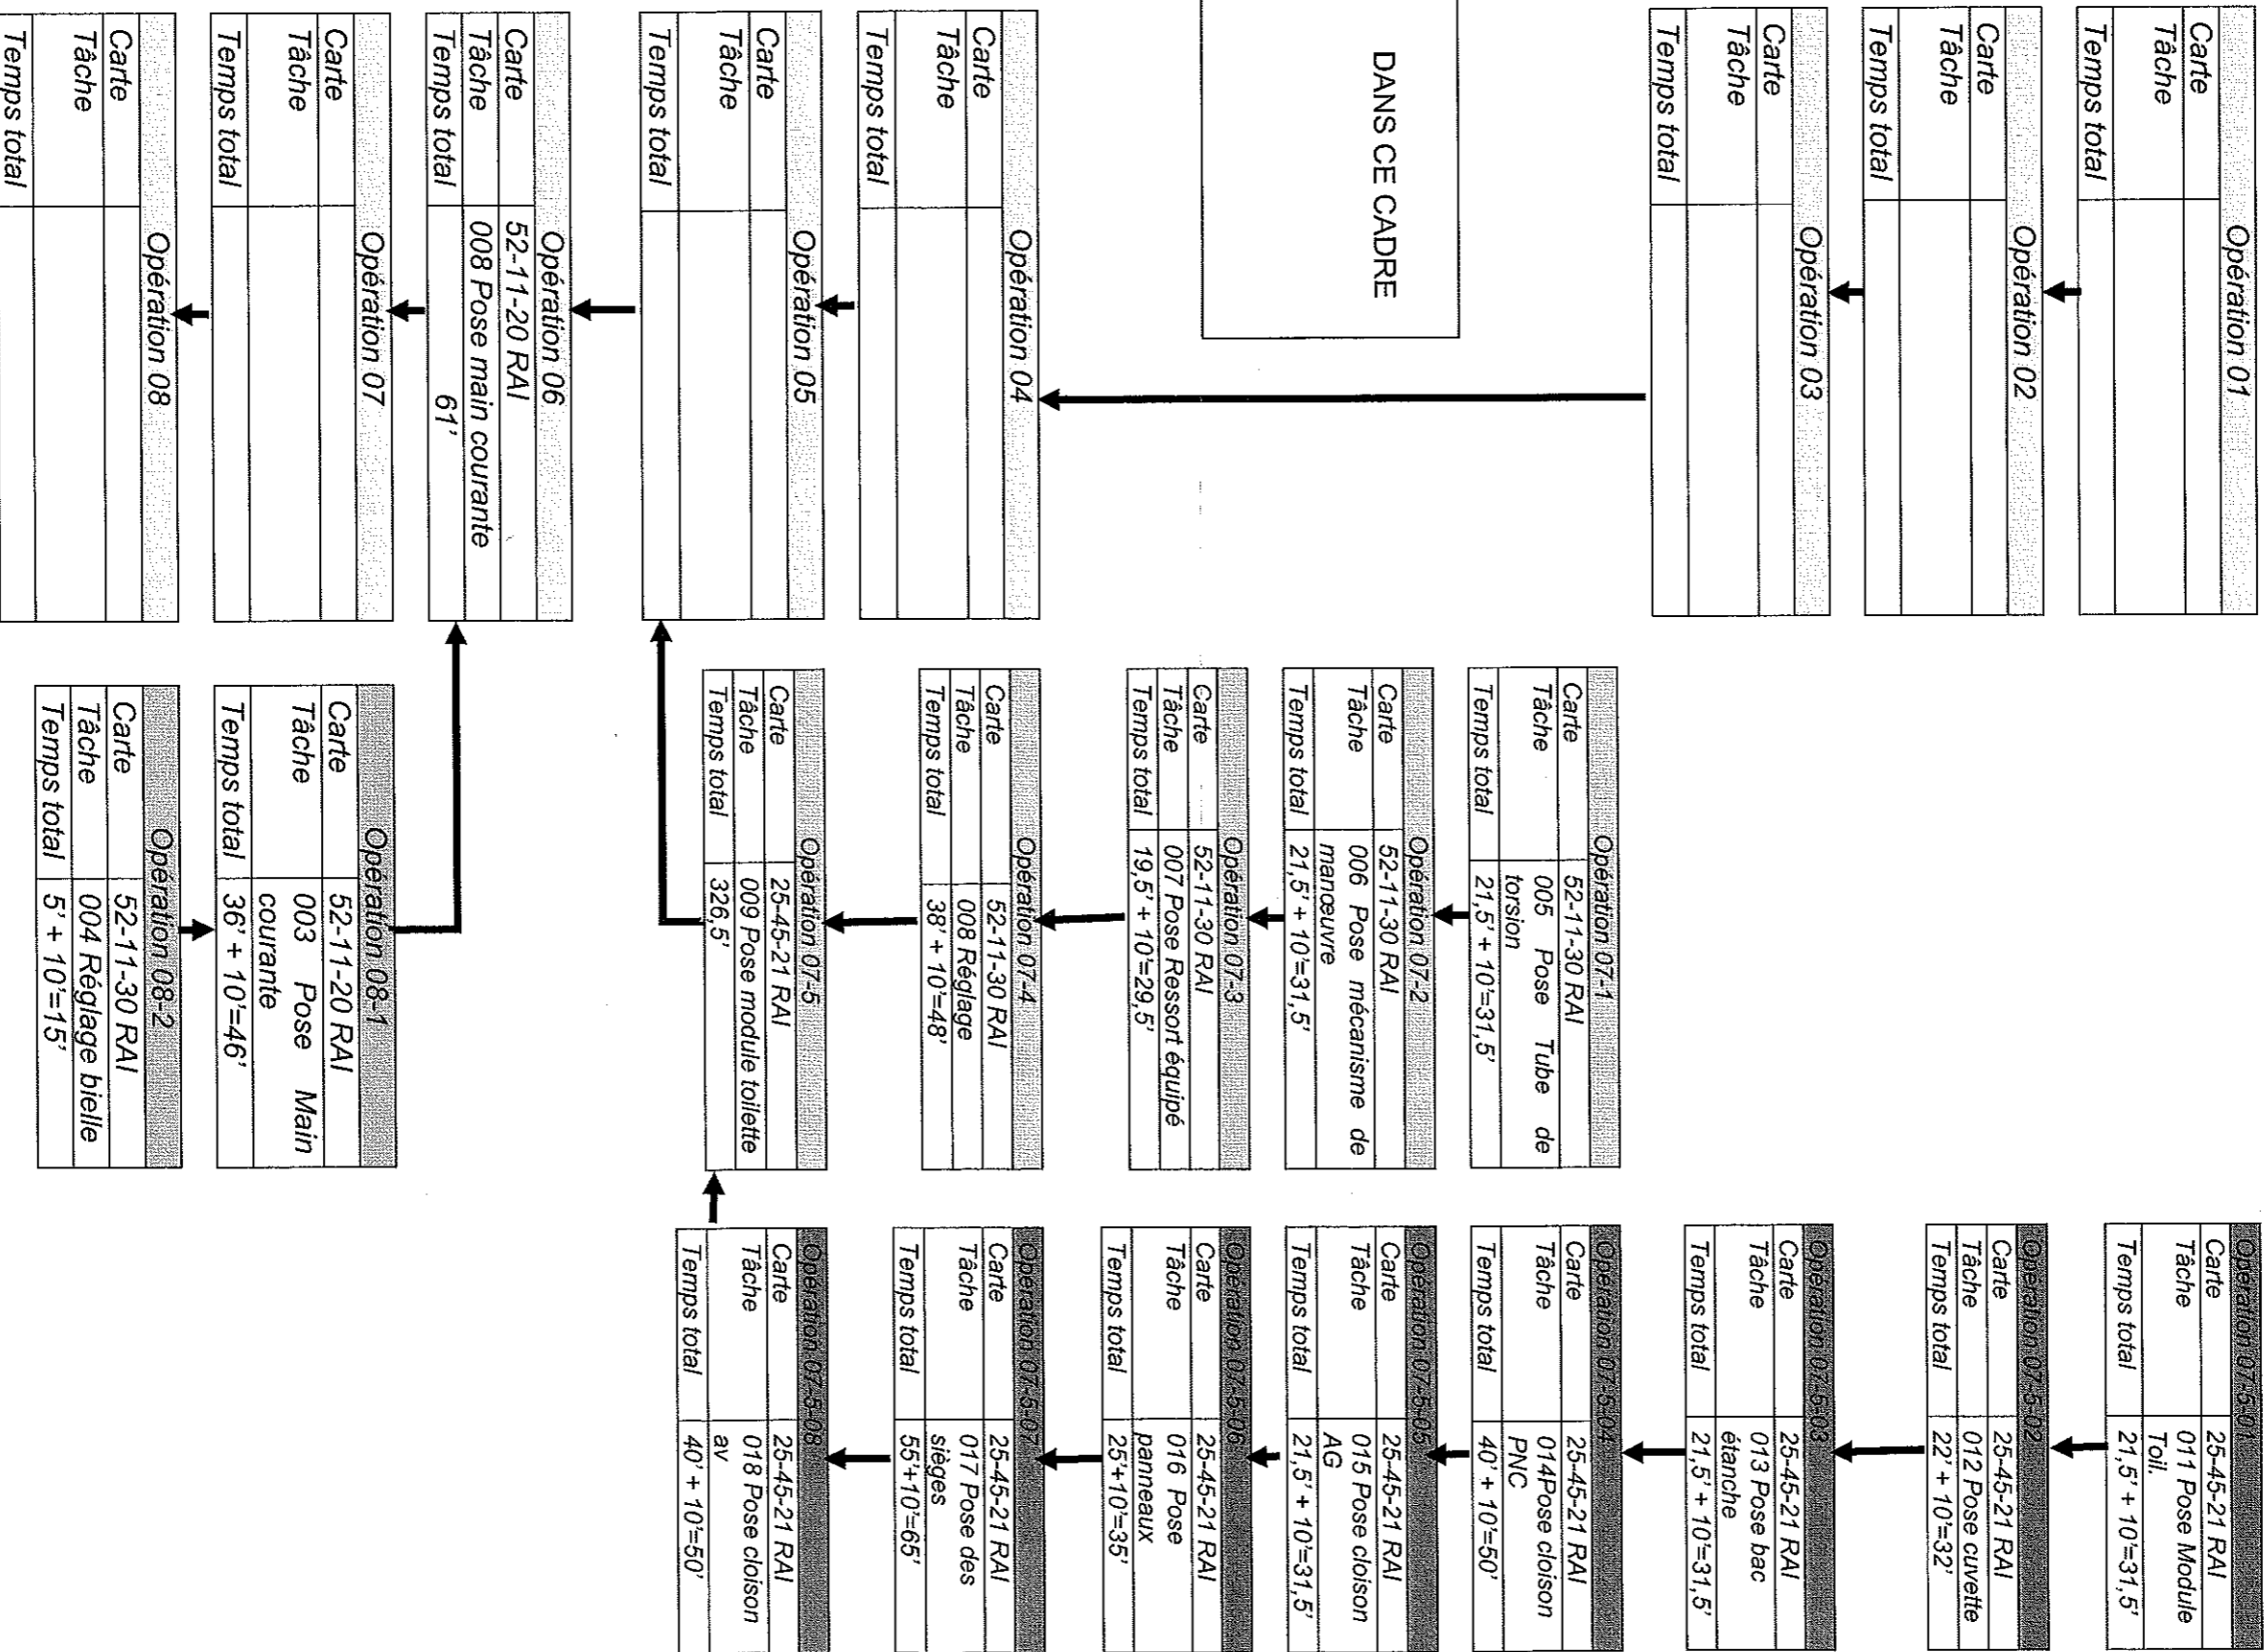

A RENDRE EN FIN D'ÉPREUVE AVEC LA COPIE

Réorganisation chantier porte

Représentation des opérations menées par l'équipe 1 sur le chantier

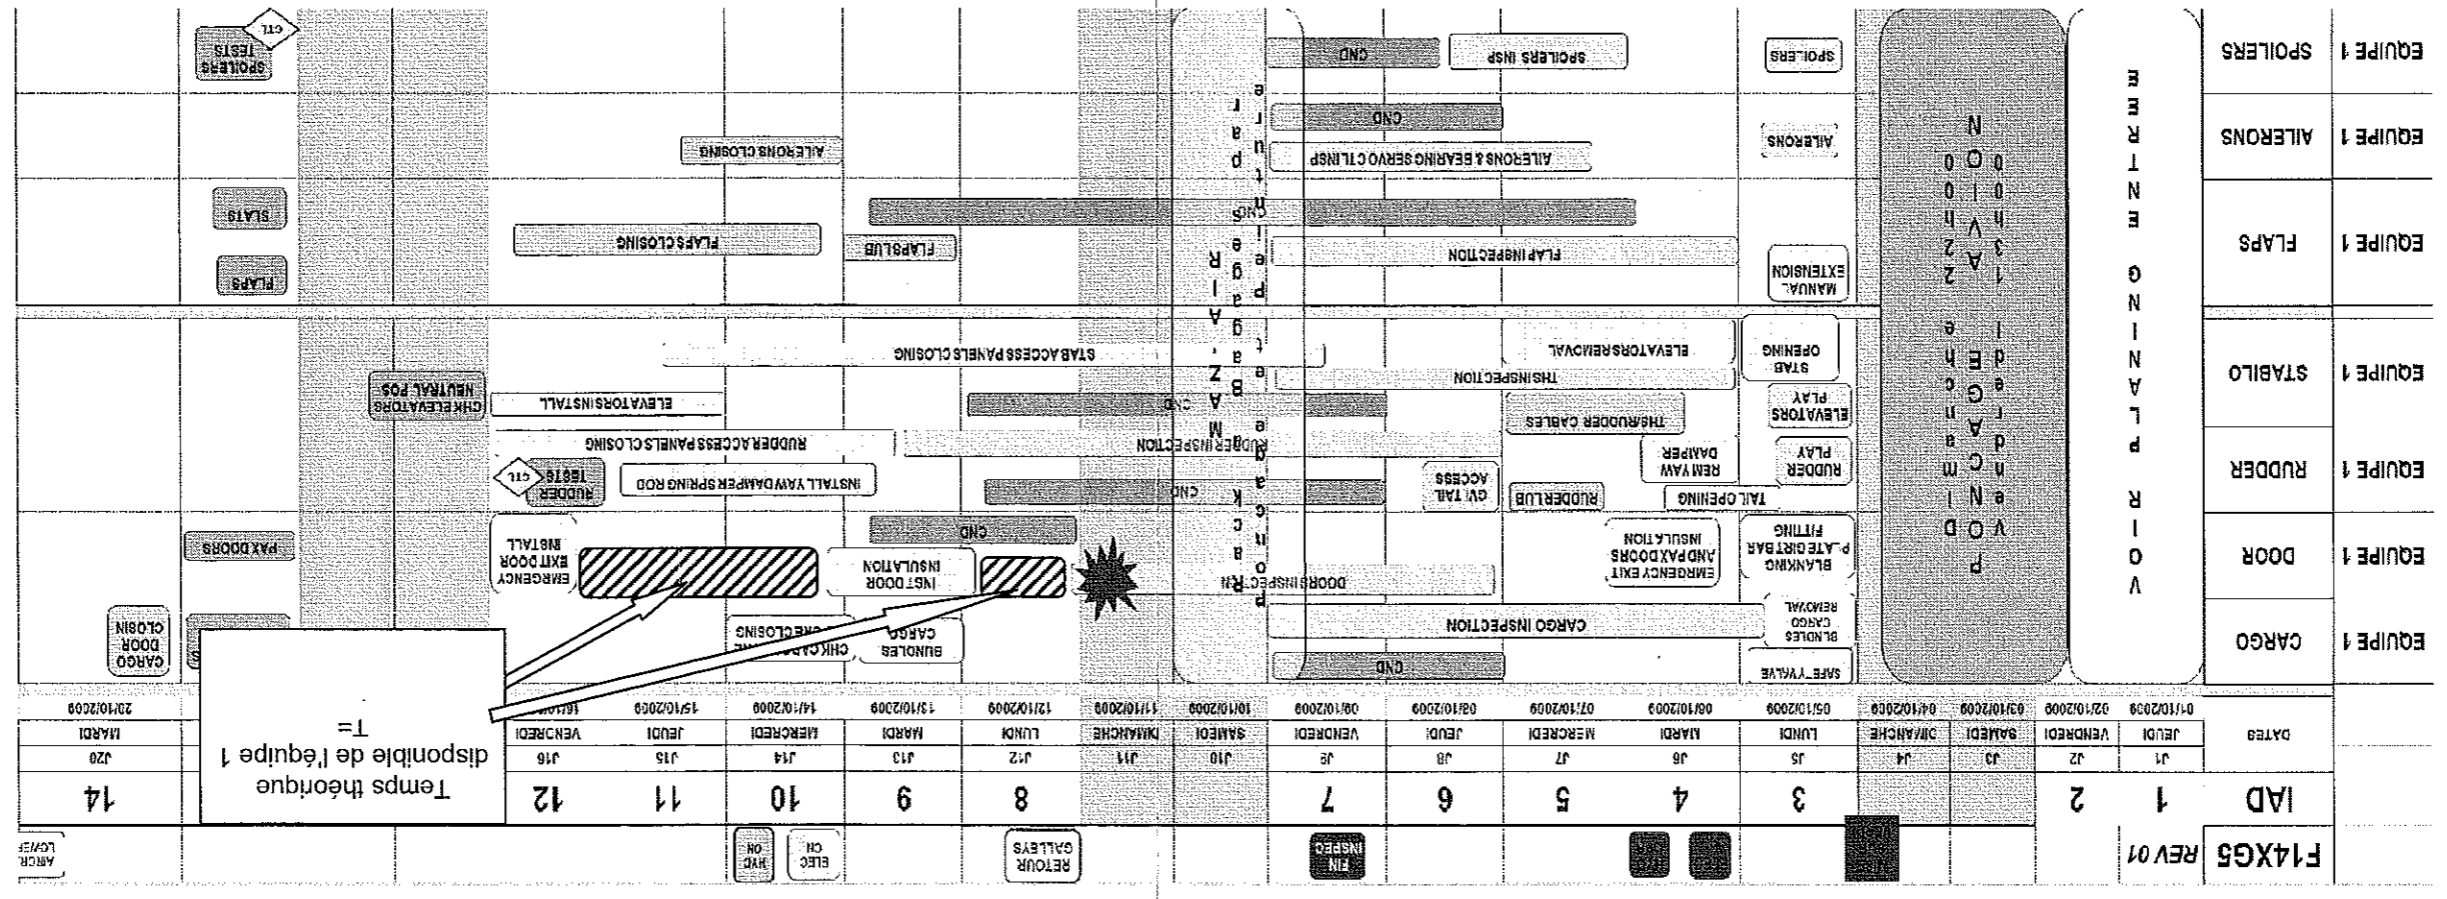

DANS CE CADRE

NE RIEN ECRIRE

DANS CE CADRE

NE RIEN ECRIRE

A RENDRE EN FIN D'ÉPREUVE AVEC LA COPIE

PLANNING CHANTIER AVION 1/2

FLAXG5	REV 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
EQUIPE 2	GCA	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	CARGO	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	DOOR	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 2	COCKPIT AND CABIN	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	RUDDER	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	STABLO	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 3	LH MLG	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 3	RH MLG	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 3	NLG	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 3	HYD	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 2	ENG1	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 2	ENG2	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	FLAPS	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	ALLERONS	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 1	SPOILERS	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 2	FUEL	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 5	ATS	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 4	EIR	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 2	STR	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 6	GAB	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 6	NETTOYAGE	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 6	MASTIC	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
EQUIPE 6	CTL & NDT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
DATES		01/10/2009	02/10/2009	03/10/2009	04/10/2009	05/10/2009	06/10/2009	07/10/2009	08/10/2009	09/10/2009	10/10/2009	11/10/2009	12/10/2009	13/10/2009	14/10/2009	15/10/2009	16/10/2009
		JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI

V O I R P L A N I N G C A G E

V e n d i t 4 1 3 h 0 0 P O N C A G E

D i m a n c h e 2 2 h 0 0

PLANING CHANTIER AVION 2/2

F14XG5		ASCAT LOWERING																
IAD	DATES	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	J25	J26	J27					J28	J27
		SAMED	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMED	DIMANCHE	LUNDI	MARDI					LUNDI	MARDI
		17/10/2009	18/10/2009	19/10/2009	20/10/2009	21/10/2009	22/10/2009	23/10/2009	24/10/2009	25/10/2009	26/10/2009	27/10/2009					28/10/2009	27/10/2009
EQUIPE 2	GCA																	
EQUIPE 1	CARGO																	
EQUIPE 1	DOOR																	
EQUIPE 2	COCKPIT AND CABIN																	
EQUIPE 1	RUDDER																	
EQUIPE 1	STABLO																	
EQUIPE 3	LH MLG																	
EQUIPE 3	RH MLG																	
EQUIPE 3	NLG																	
EQUIPE 3	HYD																	
EQUIPE 2	ENG1																	
EQUIPE 2	ENG2																	
EQUIPE 1	FLAPS																	
EQUIPE 1	AILERONS																	
EQUIPE 1	SPOILERS																	
EQUIPE 2	FUEL																	
EQUIPE 5	ATS																	
EQUIPE 4	EIR																	
EQUIPE 2	STR																	
EQUIPE 2																		
EQUIPE 6	CAB																	
EQUIPE 6	S/T CABINE																	
EQUIPE 6	NETTOYAGE																	
EQUIPE 6	MASTIC																	
EQUIPE 6	CTL & NDT																	
	DATES	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	J25	J26	J27					J28	J27
		SAMED	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMED	DIMANCHE	LUNDI	MARDI					LUNDI	MARDI
		17/10/2009	18/10/2009	19/10/2009	20/10/2009	21/10/2009	22/10/2009	23/10/2009	24/10/2009	25/10/2009	26/10/2009	27/10/2009					28/10/2009	27/10/2009

V e n d r e d i 0 7 h 0 0  
P e i n t u r e A v i o n L u n d i 0 7 h 0 0
